Trabalho Integrado	Curso:	Sistemas de Informação - 5° Período	Data
	Matérias:	PSI - BD I - IHC	05-junho-12

Atividades	Custo		Av	Equipes		Prod / Dia	Datas			
	Qtde	Falta		Cod	Nome		Dias Falta	Início	Final	Atualização
Primeira Fase							19	20-mar-12	08-abr-12	
Layout das Telas	24		100%	C	Samuel / Vitor	5	7	27-mar-12	02-abr-12	02-abr-12
Diagr. Casos de Uso	1		100%	A	Rômulo	0,5	3	20-mar-12	22-mar-12	22-mar-12
Diagr. Classes Domin.	1		100%	A	Rômulo	0,5	4	23-mar-12	26-mar-12	26-mar-12
Diagr. Seq. Sistema	4		100%	A	Rômulo	0,5	3	27-mar-12	29-mar-12	29-mar-12
Contratos de Oper.	2		100%	A	Rômulo	2	1	03-abr-12	03-abr-12	03-abr-12
DTD e DOC XML	2		100%	A	Rômulo	2	1	27-mar-12	27-mar-12	27-mar-12
Implementação MVC	10		100%	D	R / T / W	1,5	6	03-abr-12	08-abr-12	08-abr-12
Segunda Fase							30	06-abr-12	06-mai-12	
Implementação MVC	20		100%	A	Rômulo	2,5	8	06-abr-12	13-abr-12	13-abr-12
Diagr. Seq. Detalhado	3		100%	B	Túlio / Wander	0,5	8	27-abr-12	04-mai-12	04-mai-12
Diagr. Classes Projeto	4		100%	C	Samuel / Vitor	2	2	05-mai-12	06-mai-12	06-mai-12
Terceira Fase							25	13-mai-12	07-jun-12	
Implementação MVC	30		100%	E	Todos	2	22	13-mai-12	03-jun-12	03-jun-12
Diagr. Implementação	3		100%	A	Rômulo	2	2	04-jun-12	05-jun-12	05-jun-12
Finalização / Revisão	1	1		A	Rômulo	1	1	07-jun-12	07-jun-12	

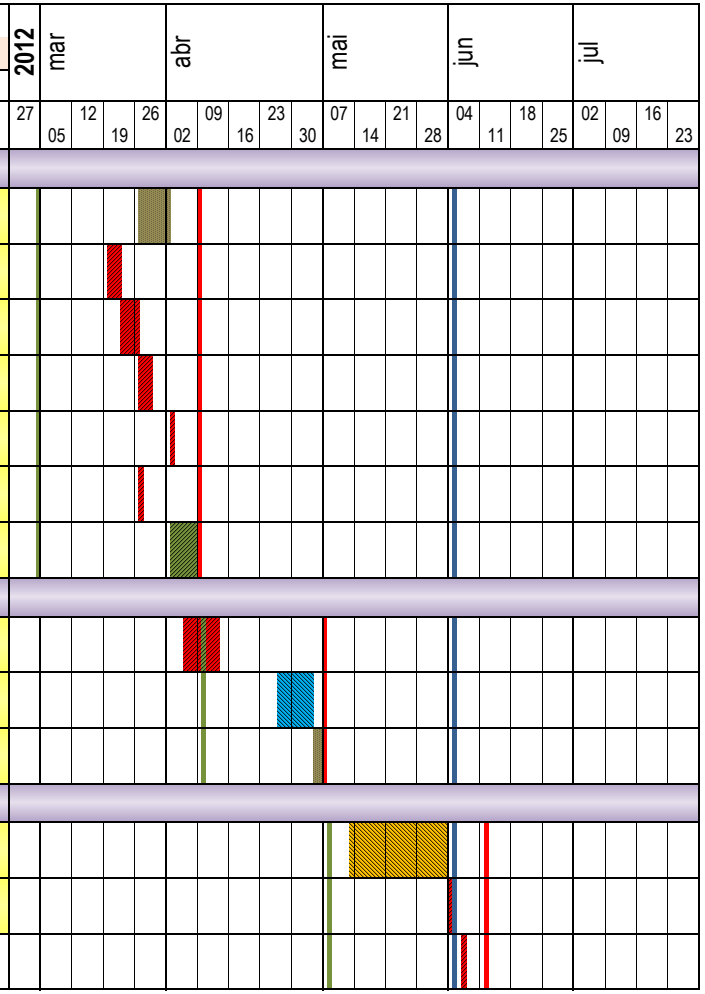

Equipes		
Nome	Cor	Cod
Rômulo	1	A
Túlio / Wander	2	B
Samuel / Vitor	3	C
R / T / W	4	D
Todos	5	E
	6	F
	7	G
	8	H

Projeto			
	Dur	Início	Final
Primeira Fase	36	04-mar-12	09-abr-12
Segunda Fase	27	10-abr-12	07-mai-12
Terceira Fase	35	08-mai-12	12-jun-12
Geral	100	04-mar-12	12-jun-12

Atrasos	
Início	Entrega
16 dia(s)	0 dia(s)
0 dia(s)	0 dia(s)
5 dia(s)	0 dia(s)
21 dia(s)	0 dia(s)

Legenda Gráfico
Data de Início da Fase
Data Atual (Hoje)
Data de Término da Fase

Autor: Rômulo Jorge

Ano: 2012
